

PROYECTOS TERMINADOS PLAN DE RECONSTRUCCION



Viviendas Reconstrucción

Programa de adquisición de viviendas (Regional)
Casa Piloto vivienda San Félix



Habilitación terreno sector Los Pintores de Chile, Copiapó



Entrega De Viviendas El Salado



Inauguración Codelin



CNT 26 De Octubre 2017



Vivienda Industrializada Los Loros / Empresa RKM




Vivienda Industrializada Los Loros / Empresa RKM



Vivienda Industrializada Los Loros / Empresa RKM



Vivienda Industrializada Diego de Almagro

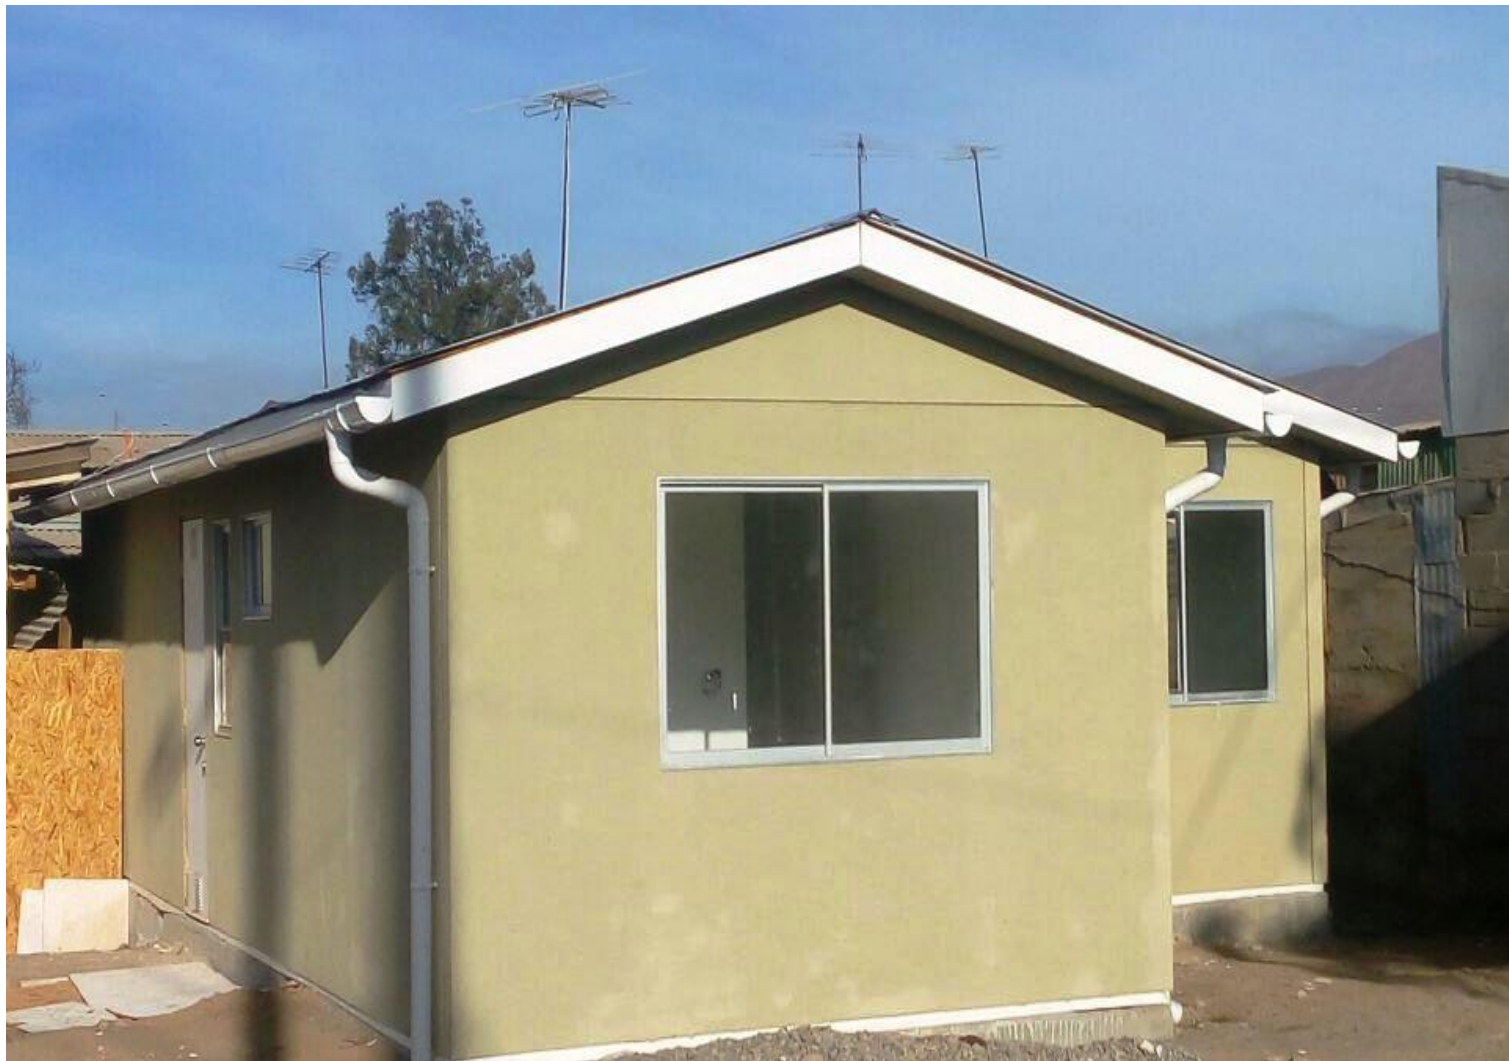

Vivienda Industrializada Diego de Almagro



Vivienda Industrializada Diego de Almagro



Entrega de Subsidios en Chañaral (22.09.16)



Urbano Reconstrucción

Conservación y Reposición Red de Ciclovías de Corto Plazo, Copiapó



Placilla Morales, Copiapó



Conservación Red vial Región de Atacama



Conservación Global mixto caminos red vial III Región Atacama
Conexión Ruta C-13, Sector Diego de Almagro Potrerillos



Conservación red vial administración directa III Región de Atacama

Ruta Diego de Almagro




Ruta Caldera Vallenar



Conservación obras portuarias menores III Región de Atacama

Borde costero Pan de Azúcar

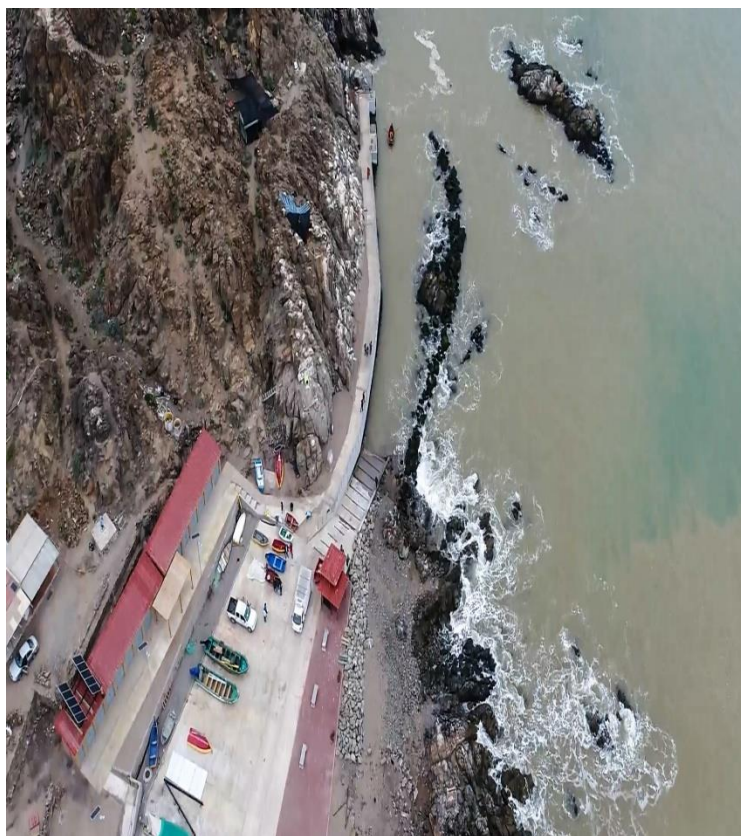

Borde costero Pan de Azúcar



Conservación de riberas y cauces naturales III Región de Atacama

Ribera sector Rio el Carmen Valle San Félix



Defensa Fluvial estación fluviométrica Huasco



Conservación de vías sector Paipote, Copiapó



FNDR



Reposición Subcomisaria Carabineros Diego de Almagro



Construcción Tranque retenedor de aguas lluvias en los Loros, Tierra Amarilla



Reposición de pavimentos Av. Diego de Almagro, Diego de Almagro



Reposición de pavimentos Av. Juan Martínez, Diego de Almagro



Reposición de pavimentos calle J.A. Ríos TR de Quiroga, Diego de Almagro



Reposición y adquisición equipamiento mayor Bomberos de la Región de Atacama



Reposición cuartel Policial Chañaral



Transferencia Programa Especial de Emergencia productiva de Atacama



Fortalecimiento en Innovación y emprendimiento de las Mipes de Atacama



Programa Transferencia mejoramiento operación de micro y pequeños empresarios del transporte Público



Conservación Estadio Luis Valenzuela Hermosilla



Establecimientos educacionales reconstrucción



Conservación Infraestructura Hospital Regional de Copiapó



Reparación Cesfam Tierra Amarilla



Mantenimiento y habilitación Hospital de Chañaral



Mantenimiento y habilitación Hospital de Diego de Almagro



ESTADO DE AVANCE PROYECTOS RECONSTRUCCIÓN ATACAMA														
N°	ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	TIPO	Estado	CODIGO BIP	Fuente de Financiamiento	Unidad Técnica	Monto Total M\$	Avance financiero	% Avance Físico	Fecha Inicio	Fecha Termino	Empresas Contratistas
1	1186	REGIONAL	1.1 Conservación Red Vial Región de Atacama - años 2015-2016 Emergencia Reconstrucción (Ver anexo 1)	Obras	Terminado	30224273-0	MOP	VIALIDAD	104.694.622	100%	100%	08-05-2015	31-12-2016	Constructora Tricam, Constructora Valko S.A., Construcciones y Pavimentos limitada, Vecchiola Ingeniería y Construcción Ltda., Ingeniería y Construcción Cosmito Ltda., San Felipe S.A. y Soinver Ingeniería S.A., etc.
2	1249	REGIONAL	1.2 Conservación Global Mixto Caminos Red Vial III Región 2011-2015(Ver anexo 2)	Obras	Terminado	30106221-0	MOP	VIALIDAD	5.956.381	100%	100%	25-03-2015	31-12-2016	Soinver Ingeniería S.A., Construcción de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A., Heropi Constructora Limitada.
3	1250	REGIONAL	1.3 Conservación Red Vial Administración Directa III Región Año 2015	Obras	Terminado	30224024-0	MOP	VIALIDAD	1.500.000	100%	100%	25-03-2015	31-12-2015	Administración directa contrato global de gastos para enfrentar la emergencia
4	1243	REGIONAL	Conservación Obras Portuarias menores III Región (Ver anexo 3)	Obras	Terminado	30080785-0	MOP	D O Portuarias	2.102.619	100%	100%	05-05-2015	28-08-2017	Constructora e Inversiones M E Ltda., Construcción de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A., Empresa Constructora Gonzalo Orellana e Hijo Ltda.

N°	ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	TIPO	Estado	CODIGO BIP	Fuente de Financiamiento	Unidad Técnica	Monto Total M\$	Avance financiero	% Avance Físico	Fecha Inicio	Fecha Termino	Empresas Contratistas
5	1294	REGIONAL	Conservación de Riberas y Cauces Naturales III Región año 2016 (Ver anexo 4)	Obras	Terminado	30392022-0	MOP	D O Hidráulica	9.225.314	100%	100%	28-03-2015	30-12-2021	R y Q Ingeniería S.A., Alfredo Edwards Ingenieros Consultores Ltda., Prisma Ingeniería Ltda., Empresa Constructora Lircay y Cía. Ltda., Rentas Maquinarias Mamoromaq Ltda., Sociedad de Ingeniería y Movimientos de Tierra del Pacifico Ltda, etc.
6	1268	Alto del Carmen	Reposición Puente Nicolás Naranjo En Ruta C-495 (Diseño)	Diseño	Ejecución	30455272-0	MOP	VIALIDAD	324.415	20%	20%	01-10-2017	30-12-2018	Ingelog consultores de Ingeniería y Sistemas S.A.
			Reposición Puente Nicolás Naranjo En Ruta C-495 (Ejecución)		Ejecución	30455272-0	MOP		2.500.000	0%	0%	00-00-2019	30-12-2021	NO APLICA
7	1244	REGIONAL	Mejoramiento Ruta 5, s: Pasada por Chañaral (Diseño)	Diseño	Ejecución	30391322-0	MOP	VIALIDAD	353.682	63%	63%	20-01-2016	09-07-2016	Ingelog consultores de Ingeniería y Sistemas S.A.
			Mejoramiento Ruta 5, s: Pasada por Chañaral (Ejecución)		Ejecución	30391322-0	MOP		8.000.000	0%	0%	00-00-2019	30-12-2021	NO APLICA

N°	ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	TIPO	Estado	CODIGO BIP	Fuente de Financiamiento	Unidad Técnica	Monto Total M\$	Avance financiero	% Avance Físico	Fecha Inicio	Fecha Termino	Empresas Contratistas
8	1245	REGIONAL	Diseño Borde Costero De Chañaral Por Reconstrucción	Diseño	Proceso	30399026-0	MOP	D O Portuarias	102.844	0%	0,00%	01-12-2017	00-12-2018	NO APLICA
			Construcción Borde Costero De Chañaral Por Reconstrucción (Ejecución)		Proceso	30399026-0	MOP		2.000.000	0%	0%	00-00-2019	00-00-2021	NO APLICA
9	1216	REGIONAL	Diseño O. Fluviales Río Copiapó y O. control a Qda. Afluentes	Diseño	Ejecución	30394731-0	MOP	D O Hidráulica	988.643	41%	52,57%	24-10-2016	16-11-2018	Siga Ingeniería y Consultoría S.A.
			Construcción Obras Fluviales Río Copiapó en Sector Rural y Obras de Control Aluvional en Quebradas Afluentes, Comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.		Ejecución	30394731-0	MOP		16.000.000	0%	0%	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	NO APLICA

N°	ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	TIPO	Estado	CODIGO BIP	Fuente de Financiamiento	Unidad Técnica	Monto Total M\$	Avance financiero	% Avance Físico	Fecha Inicio	Fecha Termino	Empresas Contratistas
10	1214	REGIONAL	Diseño Obras Fluviales y manejo de Cauces en Río Copiapó	Diseño	Ejecución	30394679-0	MOP	D O Hidráulica	4.917.816	51%	59,52%	21-11-2016	02-11-2018	GSI Ingenieros Consultores Limitada
			Construcción Obras Fluviales Río Copiapó en Sector Urbano y Manejo de Cauce en Sector Rural, Comuna de Copiapó		Ejecución	30394679-0	MOP		14.000.000	0%	0%	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	
11	1215	REGIONAL	Diseño Obras Fluviales y control Aluvional Quebrada Paipote	Diseño	Ejecución	30394729-0	MOP	D O Hidráulica	732.437	79%	82,77%	25-04-2016	05-04-2018	Alfredo Edwards Ingeniería Consultores Limitada
			Construcción de Obras Fluviales y Manejo de Cauce en la quebrada de Paipote			30394729-0	MOP		15.000.000	0%	0%	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	NO APLICA

N°	ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	TIPO	Estado	CODIGO BIP	Fuente de Financiamiento	Unidad Técnica	Monto Total M\$	Avance financiero	% Avance Físico	Fecha Inicio	Fecha Termino	Empresas Contratistas
12	1231	REGIONAL	Diseño O. Fluviales y C. Aluvional Río Copiapó Tierra Amarilla	Diseño	Ejecución	30394680-0	MOP	D O Hidráulica	879.007	43%	39,21%	07-07-2016	02-10-2018	Conic Bf Ingenieros Civiles Consultores Limitada
			Construcción de Obras Fluviales Río Copiapó en Sector Urbano y Obras de Control Aluvional Quebrada Cerrillos, Comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.		Ejecución	30394680-0	MOP		5.000.000	0%	0%	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	NO APLICA
13	1184	REGIONAL	Diseño Obras Fluviales y Control Aluvional Río Salado	Diseño	Ejecución	30394728-0	MOP	D O Hidráulica	845.244	51%	53,22%	18-07-2016	27-10-2018	ARCADIS CHILE SPA.
			Construcción de Obras Fluviales y de Control Aluvional en la cuenca del Río Salado		Ejecución	30394728-0	MOP		32.000.000	0%	0%	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	NO APLICA
14	1269	REGIONAL	Diseño O. Fluviales y C,A cuenca del Río Tránsito	Diseño	Ejecución	30394732-0	MOP	D O Hidráulica	750.555	51%	59,57%	07-12-2016	22-12-2018	UNIVERSIDAD DE CHILE
			Construcción de Obras Fluviales y Control Aluvional Cuenca del Río El Tránsito, Comuna de Alto del Carmen		Ejecución	30394732-0	MOP		11.500.000			AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	NO APLICA

N°	ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	TIPO	Estado	CODIGO BIP	Fuente de Financiamiento	Unidad Técnica	Monto Total M\$	Avance financiero	% Avance Físico	Fecha Inicio	Fecha Termino	Empresas Contratistas
15	1273	REGIONAL	Diseño O. Fluviales y C,A cuenca del Río el Carmen	Diseño	Ejecución	30394732-0	MOP	D O Hidráulica	639.362	48%	59,57%	07-12-2016	20-12-2018	Siga Ingeniería y Consultoría S.A.
			Construcción de Obras Fluviales y Control Aluvional Cuenca del Río El Carmen y Río Huasco, Comuna de Alto del Carmen		Ejecución	30394732-0	MOP		11.500.000		0%	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	NO APLICA
16	1251	REGIONAL	Mejoramiento Puente Diego De Almagro En Ruta C-17	Diseño	Ejecución	30457125-0	MOP	VIALIDAD	270.525	15%	15%	26-10-2017	06-08-2019	Ingelog consultores de Ingeniería y Sistemas S.A.
17	1189	REGIONAL	Reposición Red Hidrométrica Cuenca Del Río Copiapó (Ver anexo 5)	Obras	Ejecución	30101803-0	MOP	D G Agua	634.239	87%	87%	01-10-2016	31-12-2019	Francisco Zamorano Valdivia, Soc. Ingeniería Construcción Y Maquinaria Spa., Sociedad de Ingeniería y Servicios Terracop Spa., SKM-IRH SPA.
18	1183	REGIONAL	Reposición Red Hidrométrica Cuenca Del Río Huasco (Ver anexo 6)	Obras	Ejecución	30113715-0	MOP	D G Agua	1.861.688	53%	53%	01-10-2016	31-12-2019	Sociedad Comercial Roberto Muñoz Ltda., SKM-IRH SPA, Sociedad de Ingeniería y Servicios Terracop Spa., Sociedad Comercial Agrofarmacos L y L Ltda.
19	1188	REGIONAL	Mejoramiento Varios Puentes - Cuenca Copiapó- Región de Atacama	Diseño	Ejecución	30457123-0	MOP	VIALIDAD	1.540.016	7%	7%	15-10-2017	03-01-2020	Consultores de Ingeniería SPA.

N°	ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	TIPO	Estado	CODIGO BIP	Fuente de Financiamiento	Unidad Técnica	Monto Total M\$	Avance financiero	% Avance Físico	Fecha Inicio	Fecha Termino	Empresas Contratistas
20	1225	REGIONAL	Mejoramiento 31 Ch - Puente Paipote	Obras	Proceso	30457123-0	MOP	VIALIDAD	4.500.000	0%	0%	25-01-2018	14-04-2020	NO APLICA
21	1199	REGIONAL	Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (fsev- ds 49)	Obras	Ejecución	Subtitulo 33	MINVU	SERVIU	38.631.327	67%	67%	05-11-2015	31-12-2020	CRISTIAN ALZAMORA ZEPEDA
22	1200	REGIONAL	Programa Protección al Patrimonio Familiar	Obras	Ejecución	Subtitulo 33	MINVU	SERVIU	26.274.163	70%	70%	05-11-2015	31-12-2020	PAMPA AUSTRAL
23	1201	REGIONAL	Programa De Adquisición De Viviendas (Ds01)	Obras	Ejecución	Subtitulo 33	MINVU	SERVIU	7.798.673	102%	102%	05-11-2015	31-12-2020	MOVIC
24	1240	CHAÑARAL	Actualización Plan Regulador Y Estudio Situación De Riesgos En La Comuna De Chañaral	Estudio	Ejecución	30402925-0	MINVU	MINVU	210.000	68%	68%	03-11-2015	31-12-2018	HABITERRA LIMITADA
25	1261	DIEGO DE ALMAGRO	Actualización Prc Diego De Almagro Y Estudio De Riesgos.	Estudio	Terminado	30402926-0	MINVU	MINVU	130.000	100%	100%	01-09-2015	31-10-2017	HABITERRA LIMITADA

N°	ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	TIPO	Estado	CODIGO BIP	Fuente de Financiamiento	Unidad Técnica	Monto Total M\$	Avance financiero	% Avance Físico	Fecha Inicio	Fecha Termino	Empresas Contratistas
26	1228	TIERRA AMARILLA	Elaboración Plan Regulador Y Estudio Situación De Riesgos Comuna De Tierra Amarilla	Estudio	Ejecución	30402928-0	MINVU	MINVU	150.000	55%	55%	01-09-2015	31-12-2018	BORQUEZ Y BURR LTDA
27	1208	Copiapó	Actualización Plan Regulador Y Estudio De Riesgos De La Comuna De Copiapó.	Estudio	Ejecución	30403027-0	MINVU	MINVU	210.000	55%	55%	01-08-2015	31-12-2018	BORQUEZ Y BURR LTDA
28	1272	Alto del Carmen	Formulación Pri Huasco Y Estudios De Riesgos (San Félix Y Del Tránsito + Huasco, Freirina Y Vallenar)	Estudio	Ejecución	30402876-0	MINVU	MINVU	130.000	70%	70%	01-11-2015	31-07-2018	BORQUEZ Y BURR LTDA
29	1187	REGIONAL	Conservación Y Reposición De Vías Urbanas Y Entorno, Región Atacama	Obras	Ejecución	30415736-0	MINVU	SERVIU	19.100.000	32%	32%	29-10-2015	20-12-2021	AGZA, BITUMIX, VYGSA
30	1209	Copiapó	Conservación Y Reparación Parques Kaukari 1, Schneider Y Paipote 2	Obras	Ejecución	30415924-0	MINVU	SERVIU	3.948.000	74%	74%	23-11-2015	20-12-2020	AGZA
31	1185	Copiapó	Conservación Y Reposición Eepp Henríquez, Matta, Plazas Atacama	Obras	Ejecución	30416126-0	MINVU	SERVIU	5.668.400	64%	64%	07-12-2015	20-12-2020	SYSCO

N°	ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	TIPO	Estado	CODIGO BIP	Fuente de Financiamiento	Unidad Técnica	Monto Total M\$	Avance financiero	% Avance Físico	Fecha Inicio	Fecha Termino	Empresas Contratistas
32	1210	Copiapó	Conservación Y Reparación Red De Ciclo vías De Corto Plazo, Copiapó	Obras	Ejecución	30396785-0	MINVU	SERVIU	800.000	61%	61%	05-11-2015	31-12-2018	AGZA
33	1213	Copiapó	Habilitación Terreno Sector Los Pintores De Chile, Copiapó	Obras	Terminado	30415576-0	INTERIOR	SERVIU	224.501	100%	100%	05-05-2015	07-07-2015	OBRAS CIVILES RKM
34	1211	Copiapó	Construcción Conexión Inés De Suárez, Paipote, Copiapó (Diseño)	Diseño	Ejecución	30415575-0	MINVU	SERVIU	223.353	36%	36%	05-08-2017	30-11-2018	BITUMIX
			Construcción Conexión Inés De Suárez, Paipote, Copiapó (Ejecución)			30415575-0	MINVU		3.000.000	0%	0%	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	NO APLICA
35	1212	Copiapó	Construcción Mitigaciones de Amenazas Las Bandurrias, Copiapó (Diseño)	Diseño	Proceso	30412840-0	MINVU	SERVIU	320.000	0,16%	0%	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	NO APLICA
			Construcción Mitigaciones de Amenazas Las Bandurrias, Copiapó (Ejecución)			30412840-0	MINVU		6.000.000	0%	0%	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	NO APLICA
			Construcción Mitigaciones de Amenazas Las Bandurrias, Copiapó (Expropiación)			30412840-0	MINVU		2.800.000	0%	0%	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	NO APLICA

N°	ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	TIPO	Estado	CODIGO BIP	Fuente de Financiamiento	Unidad Técnica	Monto Total M\$	Avance financiero	% Avance Físico	Fecha Inicio	Fecha Termino	Empresas Contratistas
36	1253	CHAÑARAL	Construcción Barrio Comercial Costero Merino Jarpa, Chañaral (Diseño)	Diseño	Proceso	30478937-0	MINVU	SERVIU	250.000	0%	0%	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	NO APLICA
			Construcción Barrio Comercial Costero Merino Jarpa, Chañaral (Ejecución)			30478937-0	MINVU		2.600.000	0%	0%	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	NO APLICA
37	1234	TIERRA AMARILLA	Diseño Proyecto Urbanización Campamento Cardenal Raúl Silva Henríquez y Consolidación Área Recreacional de Borde, Tierra Amarilla	Diseño	Proceso	30412842-0	MINVU	SERVIU	130.000	0%	0,00%	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	NO APLICA
			Construcción Parque Sector Cardenal Silva Henríquez, Los Loros. (ejecución)			30412842-0	MINVU		1.500.000	0%	0%	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	NO APLICA
38	1267	Alto del Carmen	Construcción Sitios De Resguardo Miradores Alto Del Carmen (Diseño)	Diseño	Ejecución	30462797-0	MINVU	SERVIU	94.543	40%	40%	26-12-2017	16-12-2018	CRISTIAN ALZAMORA ZEPEDA
			Construcción Sitios De Resguardo Miradores Alto Del Carmen (Ejecución)			30462797-0	MINVU		2.000.000	0%	0%	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	NO APLICA

N°	ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	TIPO	Estado	CODIGO BIP	Fuente de Financiamiento	Unidad Técnica	Monto Total M\$	Avance financiero	% Avance Físico	Fecha Inicio	Fecha Termino	Empresas Contratistas
39	1275	Copiapó	Conservación de Vías Sector Paipote, Copiapó. (INTERIOR)	Obras	Terminado	no aplica	INTERIOR	SERVIU	448.800	100%	100%	02-12-2015	01-03-2016	MARCHANT
40	1241	CHAÑARAL	Construcción Macro urbanización Sector 26 De Octubre, Etapa 1, Chañaral	Obras	Ejecución	30447172-0	MINVU	SERVIU	1.670.000	65%	65%	16-12-2016	31-05-2018	INGENIERIA Y CONTRUCCION GORDON E.I.R.L.
41	1236	CHAÑARAL	Construcción Edificio Consistorial Ilustre Municipalidad Chañaral (Diseño)	Diseño	Ejecución	30036874-0	SUBDERE	D Arquitectura	136.622	63%	63%	09-08-2017	05-08-2018	CRISOSTO SHMITH ARQUITECTOS LIMITADA
			Construcción Edificio Consistorial Ilustre Municipalidad Chañaral (Ejecución) 80% SUBDER y 20% FNDR			30036874-0	SUBDERE		5.886.000	0%	0%	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	AUN NO, MIENTRAS NO ESTE TERMINADO EL DISEÑO	NO APLICA
42	1257	DIEGO DE ALMAGRO	Reposición Subcomisaria Carabineros Diego De Almagro	Obras	Terminado	30080326-0	FNDR	D Arquitectura	1.156.956	102%	102%	13-07-2016	15-05-2018	SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LTDA
43	1230	TIERRA AMARILLA	Construcción Tranque Retenedor De Aguas Lluvias En Los Loros, Tierra Amarilla	Obras	Terminado	30076463-0	FNDR	D O Hidráulica	204.570	100%	100%	23-05-2017	19-11-2017	CONSTRUCTORA LIRCAY LTDA

N°	ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	TIPO	Estado	CODIGO BIP	Fuente de Financiamiento	Unidad Técnica	Monto Total M\$	Avance financiero	% Avance Físico	Fecha Inicio	Fecha Termino	Empresas Contratistas
44	1223	Copiapó	Reposición De Veredas Y Obras Complementarias Sector Centro Copiapó	Obras	Ejecución	30116014-0	FNDR	Copiapó	3.231.109	100%	100%	21-06-2016	11-08-2018	JOHN MANUEL SOL RAMOS
45	1224	Copiapó	Conservación De Calles Y Vías Copiapó	Obras	Ejecución	30137812-0	FNDR	Copiapó	10.638.105	62%	62%	28-11-2016	18-08-2018	VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.
46	1266	DIEGO DE ALMAGRO	Reposición De Pavimentos Av. Diego De Almagro, Diego De Almagro	Obras	Terminado	30361122-0	FNDR	Diego de Almagro	704.872	100%	100%	05-05-2016	31-12-2017	SOCIEDAD DE INVERSIONES EL SALADO LIMITADA
47	1264	DIEGO DE ALMAGRO	Reposición De Pavimentos Av. Juan Martínez, Diego De Almagro	Obras	Terminado	30132184-0	FNDR	Diego de Almagro	1.002.020	100%	100%	05-05-2016	31-12-2017	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS BITUMIX S.A.
48	1265	DIEGO DE ALMAGRO	Reposición De Pavimentos Calle J.A. Ríos T R. De Quiroga D. Almagro	Obras	Terminado	30390272-0	FNDR	Diego de Almagro	385.881	100%	100%	05-05-2016	31-12-2017	RUBEN FUENTES VASQUEZ (AYTEC)
49	1221	CHAÑARAL	Conservación Caminos Básicos 2016-2018-Prov. Chañaral	Obras	Ejecución	30353377-0	FNDR	VIALIDAD	2.934.956	84%	84%	07-07-2016	31-12-2018	TERRACOP SPA

N°	ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	TIPO	Estado	CODIGO BIP	Fuente de Financiamiento	Unidad Técnica	Monto Total M\$	Avance financiero	% Avance Físico	Fecha Inicio	Fecha Termino	Empresas Contratistas
50	1222	Copiapó	Conservación Caminos Básicos 2016-2018-Prov. Copiapó	Obras	Ejecución	30353379-0	FNDR	VIALIDAD	13.252.865	32%	32%	20-10-2016	31-12-2018	CYGSA CHILE S.A.
51	1263	DIEGO DE ALMAGRO	Reposición Y Adq. Equipamiento Mayor Bomberos De R. De Atacama	Obras	Terminado	30407276-0	FNDR	BOMBEROS	160.752	100%	100%	05-05-2016	05-05-2018	RECEPTOR: JUNTA NACIONAL DE BOMBEROS DE CHILE
			Reposición y adquisición equipamiento Mayor Bomberos de R. de Atacama				FNDR		777.442	100%	100%	05-05-2016	05-05-2018	RECEPTOR: JUNTA NACIONAL DE BOMBEROS DE CHILE
			Reposición Y Adq. Equipamiento Mayor Bomberos De R. De Atacama				FNDR		1.380.335	100%	100%	05-05-2016	05-05-2018	RECEPTOR: JUNTA NACIONAL DE BOMBEROS DE CHILE
			Reposición Y Adq. Equipamiento Mayor Bomberos De R. De Atacama				FNDR		163.200	100%	100%	05-05-2016	05-05-2018	RECEPTOR: JUNTA NACIONAL DE BOMBEROS DE CHILE

N°	ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	TIPO	Estado	CODIGO BIP	Fuente de Financiamiento	Unidad Técnica	Monto Total M\$	Avance financiero	% Avance Físico	Fecha Inicio	Fecha Termino	Empresas Contratistas
52	1277	TIERRA AMARILLA	Reposición Edificio Consistorial, Tierra Amarilla	Obras	Proceso	30096128-0	FNDR	D Arquitectura	5.760.000	0%	0%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
53	1278	CHAÑARAL	Reposición Cuartel Policial Chañaral	Obras	Terminado	30076125-0	FNDR	P D I	566.617	100%	100%	05-05-2016	05-05-2018	CONSTRUCTORA DIMAR LTDA
54	1279	Copiapó	Reposición infraestructura de semáforos Copiapó	Obras	Proceso	30440745-0	FNDR	Copiapó	2.478.766	0%	0%	EN PROCESO DE CONVENIO	EN PROCESO DE CONVENIO	EN PROCESO DE CONVENIO
55	1196	REGIONAL	Transferencia Para La Inversión Y Fomento De Riego Y Drenaje	Programa	Ejecución	30394426-0	FNDR	CNR	4.500.000	63%	63%	05-05-2015	31-12-2020	RECEPTOR: CNR
56	1193	REGIONAL	Transferencia Programa Especial De Emergencia Productiva De Atacama	Programa	Terminado	30394472-0	FNDR	SERCOTEC	1.503.922	100%	100%	13-08-2015	30-08-2017	CODESSER GEDES

N°	ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	TIPO	Estado	CODIGO BIP	Fuente de Financiamiento	Unidad Técnica	Monto Total M\$	Avance financiero	% Avance Físico	Fecha Inicio	Fecha Termino	Empresas Contratistas
57	1194	REGIONAL	Fortalecimiento En La Innovación Y El Emprendimiento De Las Mipes De Atacama-Barrios Comerciales	Programa	Ejecución	30421746-0	FNDR	SERCOTEC	49.565	100%	100%	07-07-2016	30-10-217	GEDES
			Fortalecimiento En La Innovación Y El Emprendimiento De Las Mipes De Atacama-Programa Crece Sercotec			30421746-0	FNDR		266.210	100%	100%	07-07-2016	31-12-2017	GEDES
			Programa Fomento Del Emprendimiento Juvenil En Atacama			30421746-0	FNDR		905.165	27%	27%	05-04-2017	31-12-2018	CODESSER
58	1280	REGIONAL	Programa Transferencia mejoramiento operación de micro y pequeños empresarios del transporte público de pasajeros y escolar región de Atacama	Programa	Terminado	30409326-0	FNDR	SERCOTEC	928.597	100%	100%	03-12-2015	30-05-2017	CODESSER GEDES
59	1281	REGIONAL	Programa Transferencia para el desarrollo y fomento de la Pesca Artesanal Región de Atacama	Programa	Ejecución	30394372-0	FNDR	SERNAPESCA	735.180	28%	28%	30-10-2015	31-12-2019	RECEPTOR: SERNAPESCA
							SERNAPESCA		600.000	64%	100%	30-10-2015	31-12-2019	RECEPTOR: SERNAPESCA

N°	ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	TIPO	Estado	CODIGO BIP	Fuente de Financiamiento	Unidad Técnica	Monto Total M\$	Avance financiero	% Avance Físico	Fecha Inicio	Fecha Termino	Empresas Contratistas
60	1202	REGIONAL	Transferencia Asistencia Emergencia Pequeña Minería Y Artesanal De La Región	Programa	Terminado	30394577-0	FNDR	MINERIA	394.441	100%	100%	27-08-2015	27-08-2016	SEREMI MINERIA
61	1197	REGIONAL	Programa Reconstrucción Asistencia Minería Artesanal	Programa	Terminado	Sin codigo	MINERIA	MINERIA	1.218.349	100%	100%	17-05-2016	31-12-2017	RECEPTOR: ENAMI
62	1190	REGIONAL	Concurso Especial, Obras Medianas	Programa	Terminado	Concurso 53-2015	MINAGRI	CNR	2.770.000	100%	100%	17-08-2015	30-05-2018	VARIOS USUARIOS BENEFICIADOS
63	1191	REGIONAL	Concurso Especial, Obras Menores	Programa	Terminado	Concursos 29-2015	MINAGRI	CNR	1.297.000	100%	100%	17-08-2015	30-05-2018	VARIOS USUARIOS BENEFICIADOS
64	1192	REGIONAL	Concurso Especial, Pequeña Agricultura	Programa	Terminado	Concurso 30-2015	MINAGRI	CNR	406.000	100%	100%	17-08-2015	30-05-2018	VARIOS USUARIOS BENEFICIADOS
65	1195	REGIONAL	Programa De Apoyo A La Reactivación (Par)	Programa	Terminado	Sin antecedentes	CORFO	CORFO	800.000	100%	100%	17-10-2016	31-12-2017	CORPO ASOEX CODESSER

N°	ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	TIPO	Estado	CODIGO BIP	Fuente de Financiamiento	Unidad Técnica	Monto Total M\$	Avance financiero	% Avance Físico	Fecha Inicio	Fecha Termino	Empresas Contratistas
66	1282	Alto del Carmen	Adquisición De Terrenos San Félix (1,08 Ha)	Transferencia	Terminado	Sin Código SUBDERE	MINVU	SERVIU	50.000	100%	100%	31-12-2016	28-02-2017	SUCESION HERMANOS PRADO
67	1283	Alto del Carmen	Adquisición De Terrenos el transito (1,72 ha _ 2 terrenos)	Transferencia	Terminado	Sin Código SUBDERE	MINVU	SERVIU	70.000	100%	100%	31-12-2016	28-02-2017	MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
68	1284	DIEGO DE ALMAGRO	Reposición Bandejón central Av. Juan Martínez, Diego de Almagro	Obras	Terminado	30459466-0	SUBDERE	Diego de Almagro	436.355	100%	100%	20-04-2017	20-09-2017	RRS SERVICIOS SPA
69	1286	Copiapó	Conservación Estadio Luis Valenzuela Hermosilla	Obras	Terminado	30394625-0	DEPORTES	I N Deporte	2.395.219	100%	100%	01-08-2016	01-06-2017	JOHN MANUEL SOL RAMOS SERVICIO OBRAS CIVILES LTDA
70	1287	REGIONAL	Establecimientos educaciones Reconstrucción y 2da etapa (10 proyectos)	Obras	Terminado		MINEDUC	MINEDUC	4.748.761	100%	100%	28-09-2016	25-01-2017	MIGUEL ANGEL BUSTAMANTE PALMA

N°	ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	TIPO	Estado	CODIGO BIP	Fuente de Financiamiento	Unidad Técnica	Monto Total M\$	Avance financiero	% Avance Físico	Fecha Inicio	Fecha Termino	Empresas Contratistas
71	1203	Copiapó	Conservación Infraestructura Hospital Regional Copiapó	Obras	Terminado	30402324	MINSAL	MINSAL	3.037.743	100%	100%	28-01-2016	22-12-2016	INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILODRAN LTDA.
72	1204	Copiapó	Mantenión y Habilitación Hospital Regional	Obras	Terminado	S/I	MINSAL	MINSAL	726.637	100%	100%	10-04-2015	30-11-2015	OTIS CHILE Y OTRAS EMPRESAS
73	1205	Copiapó	Reposición Equipamiento Hospital Regional Copiapó	Obras	Terminado	Circular 33	MINSAL	MINSAL	683.217	100%	100%	28-05-2015	20-12-2015	VARIAS
74	1207	Copiapó	Equipamiento Unidad Apoyo Oftalmológica (uapo)	Obras	Terminado	S/I	MINSAL	MINSAL	8.782	100%	100%	03-11-2015	05-10-2016	VARIAS
75	1227	TIERRA AMARILLA	Reparaciones Cesfam Tierra Amarilla	Obras	Terminado	No corresponde, se subcont	MINSAL	MINSAL	197.054	100%	100%	23-07-2015	01-09-2015	I. MUNICIPALIDAD TIERRA AMARILLA
76	1237	CHAÑARAL	Mantenión y Habilitación Hospital Chañaral	Obras	Terminado	No corresponde, se subcont	MINSAL	MINSAL	54.470	100%	100%	11-08-2015	02-11-2015	NELSON CAMPILLAY GODOY
77	1238	CHAÑARAL	Equipamiento CESFAM Modular Chañaral	Obras	Terminado	Circular 33	MINSAL	MINSAL	217.455	100%	100%	25-05-2015	31-12-2015	VARIAS, EQUIPAMIENTO MEDICO Y VEHICULO

N°	ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	TIPO	Estado	CODIGO BIP	Fuente de Financiamiento	Unidad Técnica	Monto Total M\$	Avance financiero	% Avance Físico	Fecha Inicio	Fecha Termino	Empresas Contratistas
78	1239	CHAÑARAL	Reposición CESFAM Chañaral	Obras	Terminado	20109498	FNDR	MINSAL	3.358.652	100%	100%	07-07-2015	05-12-2016	CONSORCIO DE CONSTRUCCION DIMAR LTDA
79	1258	DIEGO DE ALMAGRO	Mantenión y Habilitación Hospital Diego Almagro	Obras	Terminado	No correponde, se subcont	MINSAL	MINSAL	129.909	100%	100%	10-07-2015	15-09-2015	CONSTRUCTORA CERRO CARMELO
80	1259	DIEGO DE ALMAGRO	Reposición Equipamiento Hospital Diego de Almagro	Obras	Terminado	Circular 33	MINSAL	MINSAL	125.312	100%	100%	22-05-2015	04-09-2015	VARIAS, EQUIPAMIENTO MEDICO.
81	1288	DIEGO DE ALMAGRO	Reposición J.I Arcoíris Localidad de El Salado - Chañaral -	Obras	Terminado	Sin código	JUNJI	JUNJI	125.427	100%	100%	02-06-2015	31-03-2016	VICTOR HUGO NUÑEZ ARANCIBIA
82	1289	REGIONAL	Programa Inversión Productiva para la Reactivación (IPRO Reemprende Atacama)	Programa	Terminado	No tiene	CORFO	CORFO	662.851	100%	100%	13-05-2015	31-12-2017	CORPRO ASOEX CODESSER
83	1290	CHAÑARAL	Programa de Reactivación Urbana y Productiva Sustentable Cuenca del Río Salado	Programa	Terminado	No tiene	CORFO	CORFO	200.000	100%	100%	29-07-2015	31-12-2017	CORPROA

N°	ID	COMUNA	CARTERA ACTUALIZADA	TIPO	Estado	CODIGO BIP	Fuente de Financiamiento	Unidad Técnica	Monto Total M\$	Avance financiero	% Avance Físico	Fecha Inicio	Fecha Termino	Empresas Contratistas
84	1291	REGIONAL	Barrios Reemprende Atacama	Programa	Terminado	No tiene	CORFO	CORFO	200.000	100%	100%	30-10-2015	31-12-2016	DESAFIO LEVANTEMOS CHILE
85	1292	REGIONAL	Iniciativa de Fomento Integrado Barrios Eco-Sustentables	Programa	Terminado	No tiene	CORFO	CORFO	165.240	100%	100%	11-11-2015	11-11-2017	ASOEX
86	1293	REGIONAL	Programa de Difusión Tecnológica Solución de viviendas industrializadas en madera	Programa	Terminado	No tiene	CORFO	CORFO	90.000	100%	100%	11-11-2015	11-11-2017	ASOEX

Anexo 1. Detalle de obras contenidas en proyecto: 1.1 Conservación Red Vial Región de Atacama - años 2015-2016 Emergencia Reconstrucción

INTERVENCIÓN	CONTRATISTA
Conservación Ruta 31- CH, Sector Cruce Chulo- Fin Cuesta Codoceo Km. 24,000 al Km. 160,000; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama.	CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA
Conservación por Emergencia Ruta C-110 Sector Cruce R-5 Caleta Pan de Azucar Km 0;000 al Km 23;450 prov Chañaral Región de Atacama - Conserv. por Emergencia Ruta C-112 Sector Cruce R-5 Las Bombas-Cruce C110 Km 0;000 al Km 17;100 Prov Chañaral Región de Atacama	CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA
Conservación Restitución Conexión Ruta 5 Norte; Sectores: Ruta 5 Norte, tramo km 1.031 al km 1.035; Av. Costanera, tramo Km. 972,00 al 976,00; Ruta C-120 (Acceso a Pan de Azúcar), tramo Dm. 0.000 al Dm. 1.054,379 y Ruta C-13, Chañaral-Diego de Almagro, tramo km. 5,0 al km 50,0; Comunas de Chañaral y Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama.	CONSTRUCTORA VALKO S.A
Conservación, Restitucioó Conexión Ruta C-13, Sector Diego de Almagro - Potrerillos, Tramo Dm. 50.000 al Dm. 140.000, Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA
Conservación, Restitución Conexión Ruta C-163, Sector Llanta- Bifurcación Potrerillos, Tramo Dm. 0,000 al Dm. 35.000, Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama.	CONSTRUCTORA VALKO S.A
Conservación por Emergencia Ruta C-17 Sector Qda Chañarcito Km 108;600 al Km 109;000 Prov Chañaral Región de Atacama	VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.
Conservación por Emergencia Ruta C-177 Sector Cruce Ruta C-13 (los patos) Qda Asiento Km 0;000 al Km 30;000; Ruta C- 269 cruce ruta C- 177 Pie cuesta Asiento - Cruce C-173 Salar de Pedernales km. 0.0 al 22.5 Prov Chañaral Región de Atacama	INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA.
Conservación por Emergencia Ruta C-253 Sector Cruce C-257 Pampa del Inca Km 14;000 al Km 48.610 ; Ruta C-257 , Sector la Finca - Las Vegas km. 9 al 20 Prov Chañaral Región de Atacama	INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA.
Conservación por Emergencia Ruta C-289 Sector Cruce C 257 Cruce C-299 Km 0;000 al Km 20;000; y C-299 Sector Cruce C-17 - El Humito Km 6,59 al 19,00 Prov Chañaral Región de Atacama	SAN FELIPE S.A.

INTERVENCIÓN	CONTRATISTA
Conservación por Emergencia Ruta C-335 Sector Cruce Ruta C-335 sector Cruce Ruta 31 Ch (puquios) Cruce C-17 (Carrera Pinto) Km 0;000 al Km 13;240 Prov Copiapó Región de Atacama	SOINVER INGENIERIA S.A.
Conservación Ruta C-35, Sector Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas, Tramo Km. 0,000 al Km. 86,000; Comuna Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Región de Atacama.	CONSTRUCTORA VISOL LTDA.
Conservación Ruta C-365, Sector Cruce Ruta 31- CH - Quebrada San Miguel, Tramo Km. 0,000 al Km. 55,200; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama.	ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.
Conservación por emergencia Ruta C-395 Sector Juntas del Potro- El Torin Km 0;000 al Km 14;710 Prov Copiapó Región de Atacama	CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA.
Conservación por emergencia Ruta C-401 Sector Cerrillos-Lomas Bayas Km 2;000 al Km 27;800 y Ruta C- 503 Sector Aguada-Carrizalillo Km 0;000 al Km 50;000 Prov. Copiapó Región de Atacama	REMAVESA S. A.
Conservación Ruta C-431, Sector Cruce C-35- Portezuelo Dadin, tramo Km. 0,000 al Km. 49,370 y Ruta C-439, Sector Cruce Ruta C-451 (Yerbas Buenas) - Cruce C-431 (Portezuelo Tirado), Tramo Km. 0,000 al Km 37,370; Comunas de Tierra Amarilla y Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama.	CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA
Conservación Ruta C-451, Sector Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Cerro Blanco, Tramo Km. 0,000 al Km. 46,300, Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama.	CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.
Conservación por emergencia Ruta C-459 Sector Cruce C-35 Las Juntas - La Guardia Km 0;000 al Km 54;000, Prov Copiapó Región de Atacama	SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA
Conservación de la Red Comunal, Obra de emergencia Ruta C-489, Alto del Carmen San Felix, Km. 0 al Km. 55, Provincia de Huasco, Región de Atacama	CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA
Conservación de la Red Comunal Ruta C-495, Sector Alto del Carmen Junta Valeriano, Tramo Km. 0,00 al Km. 66,250; Ruta C-499, Sector Variante Los Perales, Tramo Km. 0,000 al Km. 8,6000; Ruta S/R Sector Variante Chiguinto, Tramo Km. 0,000 al Km. 1,7000; Comuna de Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama	CONSTRUCTORA FV S.A.

INTERVENCIÓN	CONTRATISTA
Conservación de la Red Comunal (Conservación Puentes menores, badenes y pasarelas Prov de Huasco Sector Oriente Región de Atacama	ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.
Conservación por emergencia Ruta 31 CH, sector Copiapó- Cruce Chulo km 17;000 al km 24;000 Provincia de Copiapó Región de Atacama	VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.
Conservación por Emergencia Ruta C-141, cruce Ruta C-17- Cruce C-237; km 4;800; Ruta C- 237; sector Cruce Ruta C-13; cruce C-141; km 0;000 al km 13;000 Provincia de Chañaral Región de Atacama	SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA
Conservación por Emergencia Obras de Encauzamiento y Protección Puente Paipote en Ruta 31CH Provincia de Copiapó Región de Atacama	BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A.
Conservación Red Vial Atacama (2015 - 2016 - 2017) Contrato Global de Emergencias por Aluviones en la Región de Atacama.	VARIOS PROVEEDORES
Conservación de la Red Comunal obra de Emergencia Demolición Puente Nicolás Naranjo Antiguo en Ruta C-495 Alto del Carmen Provincia de Huasco Región de Atacama	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS TERRACOP SPA

Anexo 2. Detalle de obras contenidas en proyecto: 1.2 Conservación Global Mixto Caminos Red Vial III Región 2011-2015

INTERVENCIÓN	CONTRATISTA
Modificación del contrato nº174490 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Huasco, Sector Oriente, I Etapa, Región de Atacama).-	SOINVER INGENIERIA S.A.
Modificación del contrato nº185585 Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral, sector Poniente, I Etapa, Región de Atacama).-	SOINVER INGENIERIA S.A.
Modificación del contrato nº185586 , C. Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Copiapó, Sector Sur Oriente, I Etapa, Región de Atacama).-	CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.
Modificación del contrato nº188231 Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Copiapó sector cordillera I etapa Región de Atacama	CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.
Modificación del contrato nº198572, Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral, sector Oriente, I Etapa, Región de Atacama).-	HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA
Modificación del contrato nº198574, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Copiapó, Sector Poniente, I Etapa, Región de Atacama).-	HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA

Anexo 3. Detalle de obras contenidas en proyecto: Conservación Obras Portuarias menores III Región

INTERVENCIÓN	CONTRATISTA
Conservación de Borde Costero de Chañaral (Obras de Emergencias)	CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA.
Conservación Borde Costero Caleta Pan de Azúcar Región de Atacama. (Obras de Emergencias)	CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.
Conservación Enrocado Borde Costero Chañaral	EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA.
Conservación. Infraestructura. Portuaria de Emergencia Caleta Pan de Azúcar, Chañaral (Emergencia / Reconstrucción)	EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA.

Anexo 4. Detalle de obras contenidas en proyecto: Conservación de Riberas y Cauces Naturales III Región año 2016

INTERVENCIÓN	CONTRATISTA
Caracterización y Levantamiento de Información debido a las crecidas Aluvionales en la Cuenca del río Huasco, Región de Atacama por el Temporal del 25 y 26 de Marzo	R Y Q INGENIERIA S.A.
Caracterización y Levantamiento de Información debido a las crecidas Aluvionales en la Cuenca del río Copiapó, Región de Atacama por el Temporal del 25 y 26 de Marzo	ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA.
Caracterización y Levantamiento de Información debido a las crecidas Aluvionales en la Cuenca del río Salado, Región de Atacama por el Temporal del 25 y 26 de Marzo	PRISMA INGENIERIA LTDA.
Estudio Aerofotogramétrico Antofagasta y Tal Tal II Región y sectores cuenca río Salado, río Copiapó y río Huasco III Región, para ser utilizados en el estudio de las Crecidas Aluvionales respectivas (comparte financiamiento con región Antofagasta)	SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO GRAL. JUAN SOLER M
Reparación DD.FF. Tipo gaviones Río Copiapó, Sector Urbano, Comuna y Provincia de Copiapó, III Región Atacama.	EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA.
Prestación de Servicio, Arriendo de Maquinaria, Retiro Sedimentos y Encauces Quebradas , Sector Pob. Antena en Diego de Almagro; Prov. Chañaral.	EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA.
Prestación de Servicio, Arriendo de Maquinaria, Retiro Sedimentos en Embalse Lautaro y Encauzamiento y retiro de sedimentos en Río Copiapó, Localidad de Amolanas, Provincia de Copiapó , III Región de Atacama.	RENTAS MAQUINARIAS MAMOROMAQ LTDA
Prestación de Servicio, arriendo de maquinaria para encauzamiento Quebrada Paipote en la Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, III Región de Atacama.	LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A.
Prestación de Servicio, Arriendo de Maquinaria, Para Encauce de la Quebrada Paipote y Rio Copiapó en el Sector Toledo, en la comuna de Copiapó y encauce Rio Copiapó en los sector Municipalidad y Nantoco en Comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, III Región de Atacama.	CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA

INTERVENCIÓN	CONTRATISTA
Prestación de Servicios, Arriendo de maquinaria para encauce del Río Copiapó y afluentes sectores de San Pedro, Piedra Colgada, Bodega y Callejon El Inca dentro de la Comuna de Copiapó y Sectores de Tierra Amarilla y Cerrillos en la Comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, III Región de Atacama.	EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA.
Prestación de Servicio, arriendo de maquinaria para encauces y retiro de sedimentos Río Copiapó, Sector Toledo, San Antonio, Quebrada Melendez, Cerrillos y San Antonio.	JAIME ENRIQUE MUNDACA FERREIRA
Prestación de Servicio por arriendo de maquinaria para encauce de Quebrada Paipote en la Comuna de Copiapó y Quebradas de las Localidades de Marqueza y El Olivo en la Comuna de Alto del Carmen.	SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA.
Arriendo de maquinaria para encauzamiento y retiro de sedimentos en Rio el Carmen y quebradas afluentes varios sectores valle San Félix provincia de Huasco III Región de atacama	SOC. DE ING. Y MOV. DE TIERRA DEL PACIFICO LTDA.
Prestación de Servicios, arriendo de maquinarias para encauzamiento del Río El Salado, varios sectores de la Comuna de Chañaral y Diego de Almagro.	OBRAS CIVILES LGP. S.A.
Prestación de servicio, arriendo de maquinaria para encauzamiento y retiro de sedimentos en quebradas afluentes Rio el Tránsito varios sectores Valle el Tránsito, Comuna de Alto del Carmen, Provincia de Huasco, III Región de Atacama.	SOC. DE ING. Y MOV. DE TIERRA DEL PACIFICO LTDA.
Prestación de Servicios arriendo de maquinaria para el encauzamiento del Río El Carmen, en el Valle de San Félix, Comuna de Alto del Carmen.	EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA
Prestación de Servicio arriendo de maquinaria para limpieza de las Quebradas Sacramento y Cardenal Silva Henríquez en la localidad de Los Loros, Comuna de Tierra Amarilla , Provincia de Copiapó , III Región de Atacama.	ARAYA HNOS S. A.
Prestación de Servicio, arriendo de maquinaria para encauce del Río Copiapó y afluentes sectores de San Pedro, Piedra Colgada, Bodega, Ciudad de Copiapó, Callejón El Inca dentro de la Comuna de Copiapó y sectores de Tierra Amarilla, Cerrillos y Los Loros en la Comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, III Región de Atacama.	EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA.
Prestación de servicio, arriendo de maquinaria para encauzamiento y retiro de sedimentos en Río El Salado, sectores Diego de Almagro, en la Comuna de Diego de Almagro y Ciudad de Chañaral y Localidad El Salado en la Comuna de Chañaral, Provincia de Chañaral, III Región de Atacama.	SERV. DE ING. CONST. Y PROY. INGEPROC SPA

INTERVENCIÓN	CONTRATISTA
Prestación de servicio, arriendo de maquinaria para encauzamiento limpieza y retiro de sedimentos Río El Salado, en las Comunas de Chañaral y Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, III Región de Atacama.	LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A.
Prestación de Servicio arriendo de maquinaria para confección de Pretiles en el Río El Carmen, Valle San Félix, Comuna de Alto del Carmen, Provincia de Huasco, III Región de Atacama.	LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A.
Prestación de servicio arriendo de maquinaria para encauzamiento del Río El Tránsito junto a varias Quebradas Valle del Tránsito, Comuna de Alto del Carmen, Provincia de Huasco, III Región de Atacama.	ARAYA HNOS S. A.
Prestación de Servicio arriendo de maquinaria para encauce del Río Huasco en vario sectores de la Comuna de Vallenar, Provincia del Huaco, III Región de Atacama.	CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA
Prestación de Servicio arriendo de maquinaria para encauzamiento Quebrada Paipote y limpieza del Río Copiapó, en la Comuna de Copiapó y encauzamiento de las Quebradas Cardenal Silva Henríquez y Sacramento, en la localidad de Los Loros, Comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, III Región de Atacama.	SERV. DE ING. CONST. Y PROY. INGEPROC SPA
Conservación de riberas de emergencia varios sectores rio el Carmen, valle San Félix, comuna Alto del Carmen, región de Atacama.	SOC. DE ING. Y MOV. DE TIERRA DEL PACIFICO LTDA
Conservación de riberas de emergencia varios sectores rio el Tránsito valle el transito comuna de Alto del Carmen, región de Atacama	SOC. DE ING. Y MOV. DE TIERRA DEL PACIFICO LTDA.
Conservación de riberas de emergencia rio Jorquera valle de Copiapó, comuna de Tierra Amarilla, región de Atacama	LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A.
Prestación de servicio arriendo de maquinaria para encauce del rio el Carmen en localidades de Cerro Blanco y Las Breas junto a la canalización de la Quebrada Las Breas y Torre, Valle de San Félix comuna de Alto del Carmen, provincia de Huasco III región de Atacama.	MAYCO S.P.A.
Prestación de servicio arriendo de maquinaria para encauce del rio el Carmen en localidad de Crucesita, valle de San Félix, comuna de Alto del Carmen provincia de Huasco, III región de atacama.	EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA.

INTERVENCIÓN	CONTRATISTA
Conservación de riberas de emergencia rio Copiapo, sector Pastillo, valle de Copiapó comuna de Tierra Amarilla, región de Atacama.	MOVIMIENTO DE TIERRA TAMAYA Y COMPANIA
Conservación de riberas de emergencia rio Copiapó sector cerrillos-pabellón valle de Copiapó comuna de Tierra Amarilla Región de Atacama	LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A.
Prestación de servicios por arriendo de maquinarias para limpieza de tranque retenedor N°10, sector población Pintores de Chile ciudad, comuna y provincia de Copiapó, Región de Atacama.	CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA
Modificación prestación de servicio, arriendo de maquinaria para encauces y retiro de sedimentos Rio Copiapó, sector Toledo, San Antonio, Quebrada Meléndez, Cerrillos y San Antonio – III Región de Atacama.	JAIME ENRIQUE MUNDACA FERREIRA
Conservación de Riberas Rio El Transito varios sectores Valle El Transito Comuna de Alto del Carmen	SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA.
Conservación pretil de emergencia Qda Cardenal Silva Henríquez, sector Los Loros, Tierra Amarilla.	EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA.
Conservación de riberas Rio Salado ,sector población 26 de Octubre, comuna de Chañaral, Región de Atacama	SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA
Conservación de riberas quebrada La Vega - sector La Vega - comuna de Alto del Carmen - Región de Atacama.	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS TERRACOP SPA
Conservación de riberas Rio El Tránsito sector La Placeta comuna de Alto del Carmen Región de Atacama.	SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA.
Conservación de riberas Rio Copiapó sector poblaciones Algarrobo y Cancha de Carrera, etapa I - comuna de Tierra Amarilla - Región de Atacama.	EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA.

INTERVENCIÓN	CONTRATISTA
Conservación de riberas río el Carmen varios sectores Valle San Félix comuna de Alto del Carmen Región de Atacama	CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA
Conservación de Riberas Río el Huasco varios sectores Región de Atacama	SOC. DE ING. Y MOV. DE TIERRA DEL PACIFICO LTDA.
Arriendo De Maquinaria Para Emergencia Sector Rio Salado Comuna Diego de Almagro Provincia de Chañaral Región de Atacama	LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A.
Arriendo de Maquinaria para Emergencia Rio El Carmen Valle de San Félix Sector La Arena Comuna de Alto del Carmen	LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A.
Arriendo de Maquinaria para Emergencia Quebrada El Bolsillo en Localidad de Chollay Quebrada Anselmo en Localidad de La Arena y Quebrada Los Tambos en Localidad de Los Tambos Comuna de Alto del Carmen Provincia de Huasco - Región de Atacama	EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA.
"Arriendo de Maquinaria para Río El Carmen sector Retamo"	LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A.

Anexo 5. Detalle de obras contenidas en proyecto: Reposición Red Hidrométrica Cuenca del Río Copiapó

INTERVENCIÓN	CONTRATISTA
Asesoría a la inspección fiscal al contrato reposición de la red hidrométrica cuenca rio Copiapó	FRANCISCO ZAMORANO VALDIVIA
Reposición estación rio Copiapó en la puerta	SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA
Consultoría especializada para implementación de la plataforma hidrogeológica del centro de información hidrológica de la DGA en la región de atacama	No Existe Adjudicado
Reposición de la red hidrométrica estación fluviometrica rio manflas de la cuenca del rio Copiapó	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS TERRACOP SPA
Asesoría Inspección Fiscal Ingeniería y ejecución de los proyectos de reposición redes hidrométricas cuencas Copiapó y Huasco Fase 2017	SKM-IRH SPA
Global de equipos para la reposición red hidrométrica cuenca rio Copiapó (emergencia)	VARIOS PROVEEDORES
Adquisición de equipos para la red hidrometeorológica región de Atacama	VARIOS PROVEEDORES
Construcción obras de defensa fluvial estación fluviométrica río Copiapó en la Puerta	SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA

Anexo 6. Detalle de obras contenidas en proyecto: Reposición Red Hidrométrica Cuenca Del Río Huasco

INTERVENCIÓN	CONTRATISTA
Reposición de la red piezometrica de la cuenca del rio Huasco fase 1	SOCIEDAD COMERCIAL ROBERTO MUNOZ LTDA.
Combustible, inspección fiscal y publicaciones del proyecto de reconstrucción Huasco	VARIOS PROVEEDORES
Asesoría Inspección Fiscal Ingeniería y ejecución de los proyectos de reposición redes hidrométricas cuencas Copiapó y Huasco Fase 2017	SKM-IRH SPA
Ingeniería de detalles para la ejecución de obras estación fluviométrica río Huasco	CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA
Construcción de 4 nuevas estaciones piezométricas DGA, emplazadas en la cuenca del río Huasco, en los Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común de: Río El Tránsito, Santa Juana y Vallenar Alto	SOCIEDAD COMERCIAL ROBERTO MUNOZ LTDA.
Adquisición de equipos para la red hidrometeorológica región de Atacama	VARIOS PROVEEDORES
Asesoría A La Inspección Fiscal Para El Seguimiento Y Control De Ejecución De Obras Fluviométricas	SKM-IRH SPA
Reposición de la red hidrométrica de la cuenca del rio Huasco, fase 2017	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS TERRACOP SPA
Construcción de obras de defensa fluvial estación fluviométrica Huasco en pinte	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS TERRACOP SPA
Construcción de estaciones fluvimetricas cuenca Huasco (E F Rio Huasco en El Maitén)	No Existe Adjudicado


INTERVENCIÓN	CONTRATISTA
Reposición Red hidrométrica cuenca del rio Huasco III Región (nuevo)	No Existe Adjudicado
Conservación y mantención de las estaciones fluviométricas de las cuencas de los ríos Huasco y Copiapó	SOCIEDAD COMERCIAL AGROFARMACOS L & L LTDA.
Adquisición equipos registradores de datos con trasmisión vía celular para red piezometrica dga - región de Atacama	VARIOS PROVEEDORES

	2010	2011
TOTAL INGRESOS	14.866.005	15.684.984
RENTAS DE LA PROPIEDAD	120.722	124.706
OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.017	7.249
APOORTE FISCAL	6.038.786	3.939.422
90% FNDR ART. 76 LEY N° 19.175	6.038.786	3.939.422
FONDO DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD	-	-
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL	8.694.480	11.608.607
BIENES NACIONALES	132.100	136.459
TRANSFERENCIA SUBDERE	5.911.360	8.380.782
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	-	-
FONDO APOYO A REGIONES (FAR)	-	-
PLAN RECONSTRUCCION ATACAMA	-	-
OTRAS TRANSFERENCIAS SUBDERE	5.911.360	8.380.782
PATENTES MINERAS	2.447.611	2.528.381
CASINOS DE JUEGOS	203.409	516.500
DERECHOS DE AGUAS	-	46.485
FONDO DE INVERSION Y RECONVERSION REGIONAL	-	-
PATENTES DE ACUICULTURA	-	-
SALDO INICIAL DE CAJA	5.000	5.000

2012	2013	2014	2015	2016
27.391.870	36.847.759	38.023.217	45.334.900	58.015.729
128.198	159.561	163.070	167.962	174.345
7.452	349.159	356.837	367.542	381.509
14.105.200	17.212.092	17.677.698	21.152.644	20.455.668
14.105.200	12.817.384	14.769.333	17.604.783	16.854.564
-	4.394.708	2.908.365	3.547.861	3.601.104
13.146.020	19.121.947	19.820.612	22.804.090	32.274.304
140.280	475.910	490.187	504.893	524.079
6.257.073	7.045.993	6.675.584	9.892.322	21.551.733
-	607.465	927.000	1.669.346	4.280.095
6.257.073	6.438.528	5.688.038	8.222.976	8.291.616
-	-	-	-	8.980.022
-	-	60.546	-	-
4.413.867	5.851.565	6.341.962	5.896.066	6.074.348
626.743	799.861	997.013	850.739	981.165
121.419	225.472	401.437	455.625	428.543
1.481.765	4.566.845	4.856.371	5.144.645	2.652.940
104.873	156.301	58.058	59.800	61.496
5.000	5.000	5.000	842.662	4.729.903


2017	2018
59.738.052	59.742.273
179.575	184.244
392.954	403.171
20.989.549	22.004.867
17.359.540	18.251.893
3.630.009	3.752.974
36.428.536	36.579.822
539.801	553.836
20.341.972	25.584.692
412.000	974.700
9.597.494	9.991.143
10.332.478	14.618.849
-	-
11.147.404	6.095.577
851.802	850.631
482.506	456.504
2.960.913	2.971.856
104.138	66.726
1.747.438	570.169

	2010	2011
TOTAL INGRESOS	19.344.360	19.751.043
RENTAS DE LA PROPIEDAD	157.089	157.034
OTROS INGRESOS CORRIENTES	9.131	9.128
APOORTE FISCAL	7.857.959	4.960.649
90% FNDR ART. 76 LEY N° 19.175	7.857.959	4.960.649
FONDO DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD	-	-
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL	11.313.675	14.617.936
BIENES NACIONALES	171.895	171.834
TRANSFERENCIA SUBDERE	7.692.146	10.553.354
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	-	-
FONDO APOYO A REGIONES (FAR)	-	-
PLAN RECONSTRUCCION ATACAMA	-	-
OTRAS TRANSFERENCIAS SUBDERE	7.692.146	10.553.354
PATENTES MINERAS	3.184.949	3.183.820
CASINOS DE JUEGOS	264.686	650.394
DERECHOS DE AGUAS	-	58.535
FONDO DE INVERSION Y RECONVERSION REGIONAL	-	-
PATENTES DE ACUICULTURA	-	-
SALDO INICIAL DE CAJA	6.506	6.296
% VARIACION ANUAL		2,1%
Fuente: DIPRES - Ley de Presupuestos		

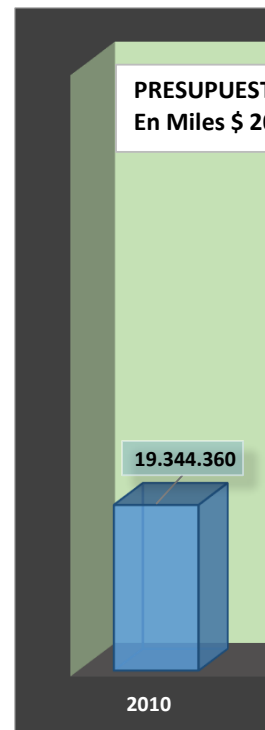


PRESUPUESTOS DE INVERSION ATACAMA	2010	2011
PRESUPUESTO INICIAL	19.344.360	19.751.043
PRESUPUESTO FINAL	36.677.908	43.645.744

VARIACION FINAL / INICIAL	89,6%	121,0%
Fuente: DIPRES - Ley de Presupuestos - SUBDERE - DDR		
Nota: Presupuesto final 2018, vigente al 30 de junio.		

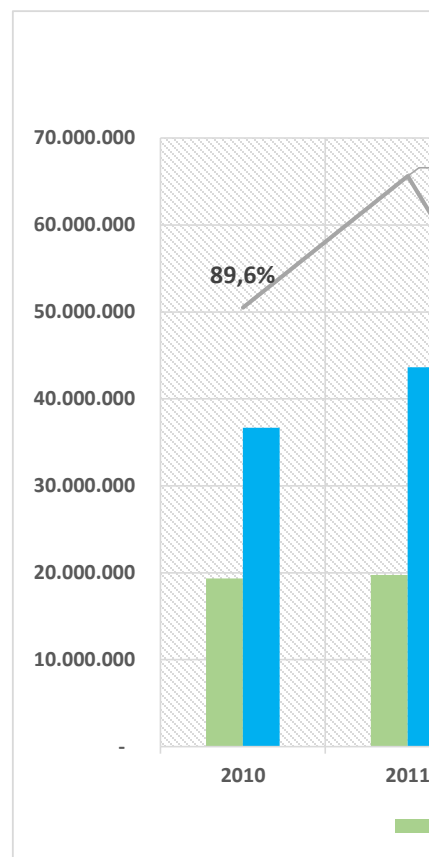

2012	2013	2014	2015	2016
33.485.494	44.254.212	43.607.811	49.826.497	61.429.374
156.717	191.633	187.021	184.603	184.603
9.110	419.340	409.247	403.957	403.957
17.243.058	20.671.748	20.274.079	23.248.362	21.659.280
17.243.058	15.393.697	16.938.553	19.348.993	17.846.287
-	5.278.050	3.335.526	3.899.369	3.812.993
16.070.497	22.965.486	22.731.730	25.063.426	34.173.324
171.487	571.569	562.182	554.916	554.916
7.649.028	8.462.248	7.656.049	10.872.413	22.819.837
-	729.566	1.063.152	1.834.738	4.531.936
7.649.028	7.732.682	6.523.459	9.037.675	8.779.495
-	-	-	-	9.508.406
-	-	69.439	-	-
5.395.780	7.027.738	7.273.427	6.480.224	6.431.763
766.169	960.634	1.143.448	935.027	1.038.897
148.430	270.792	460.397	500.766	453.758
1.811.400	5.484.788	5.569.642	5.654.355	2.809.039
128.203	187.718	66.585	65.725	65.114
6.112	6.005	5.734	926.150	5.008.210
69,5%	32,2%	-1,5%	14,3%	23,3%

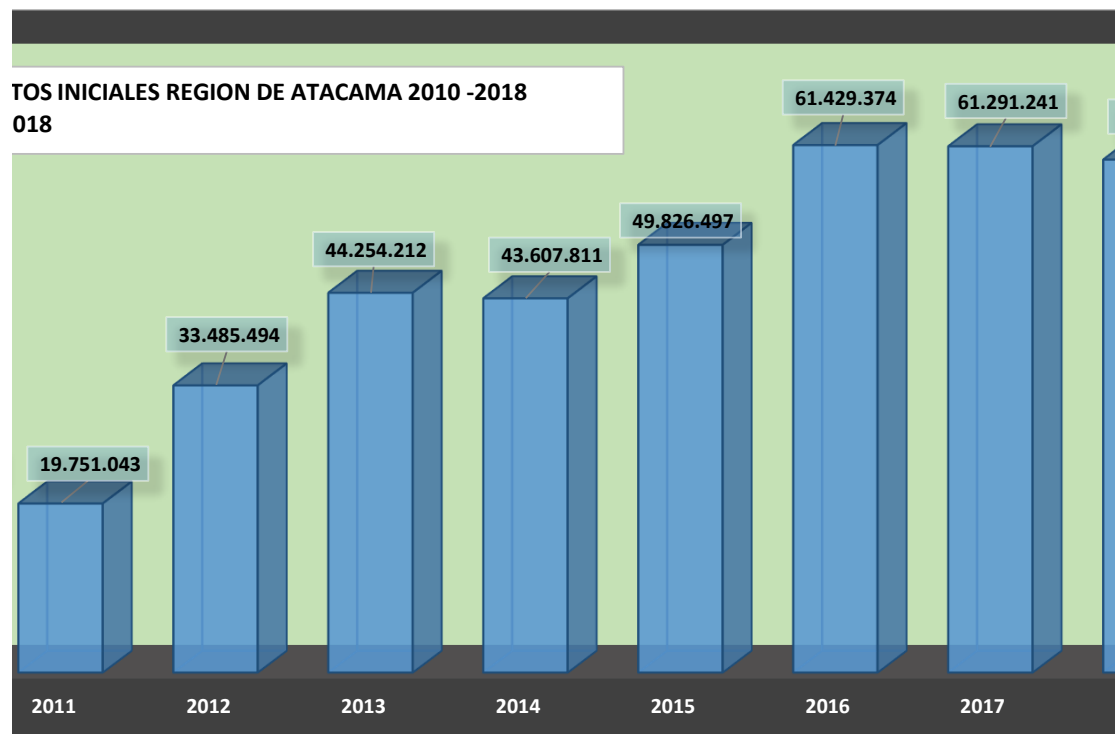


2012	2013	2014	2015	2016
33.485.494	44.254.212	43.607.811	49.826.497	61.429.374
52.231.883	55.159.391	48.412.698	44.958.525	59.155.591


56,0%	24,6%	11,0%	-9,8%	-3,7%
-------	-------	-------	-------	-------

PRESUPUESTOS DE INVERSION REGION DE ATACAMA 2010 - 2018

Montos en Miles de \$ 2018

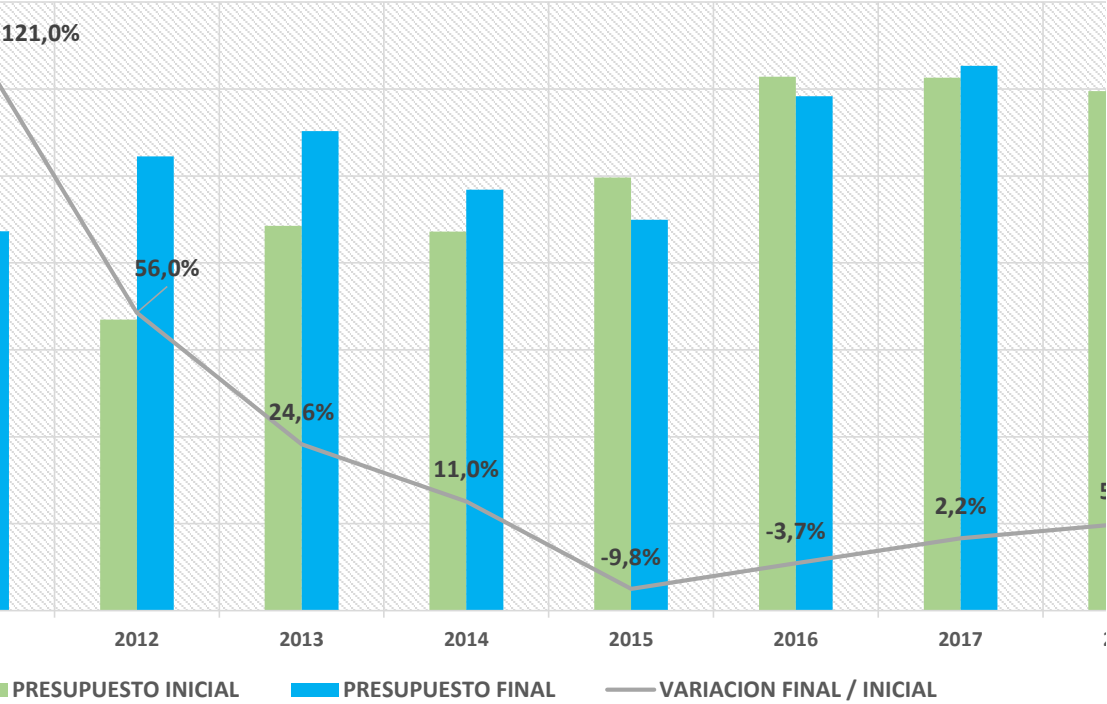


2017	2018
61.291.241	59.742.273
184.244	184.244
403.171	403.171
21.535.277	22.004.867
17.810.888	18.251.893
3.724.389	3.752.974
37.375.678	36.579.822
553.836	553.836
20.870.863	25.584.692
422.712	974.700
9.847.029	9.991.143
10.601.122	14.618.849
-	-
11.437.237	6.095.577
873.949	850.631
495.051	456.504
3.037.897	2.971.856
106.846	66.726
1.792.871	570.169
-0,2%	-2,5%



2017	2018	PROMEDIO
61.291.241	59.742.273	43.636.923
62.648.915	63.182.275	51.785.881

2,2%	5,8%	33,0%
------	------	-------




	2010	2011	2012
TOTAL INGRESOS	19.344.360	19.751.043	33.485.494
RENTAS DE LA PROPIEDAD	157.089	157.034	156.717
OTROS INGRESOS CORRIENTES	9.131	9.128	9.110
90% FNDR ART. 76 LEY N° 19.175	7.857.959	4.960.649	17.243.058
FONDO DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD	-	-	-
BIENES NACIONALES	171.895	171.834	171.487
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	-	-	-
FONDO APOYO A REGIONES (FAR)	-	-	7.649.028
PLAN RECONSTRUCCION ATACAMA	-	-	-
OTRAS TRANSFERENCIAS SUBDERE	7.692.146	10.553.354	-
PATENTES MINERAS	3.184.949	3.183.820	5.395.780
CASINOS DE JUEGOS	264.686	650.394	766.169
DERECHOS DE AGUAS	-	58.535	148.430
FONDO DE INVERSION Y RECONVERSION REGIONAL	-	-	1.811.400
PATENTES DE ACUICULTURA	-	-	128.203
SALDO INICIAL DE CAJA	6.506	6.296	6.112


	2010	2011	2012
TOTAL INGRESOS	19.344.360	19.751.043	33.485.494
OTROS INGRESOS	7.864.872	10.725.812	171.939
APORTE FISCAL	7.857.959	4.960.649	17.243.058
INGRESOS PROPIOS (PATENTES)	3.621.530	4.064.582	6.610.069
PLAN RECONSTRUCCION ATACAMA	-	-	-
FONDO APOYO A REGIONES (FAR)	-	-	7.649.028
FONDO DE INVERSION Y RECONVERSION REGIONAL	-	-	1.811.400

Fuente: DIPRES - Ley de Presupuestos - SUBDERE - DDR

Notas:

- 1.- Otros Ingresos considera: Rentas de la propiedad, Otros Ingresos Corrientes, Fondo de Infraestructura
- 2.- Aporte Fiscal considera: 90% FNDR Ley N° 19.175 y Fondo de innovación para la Competitividad
- 3.- Ingresos Propios considera: Bienes Nacionales, Patentes Mineras, Casinos de juegos, Derechos de Agua
- 4.- Fondo de Inversión y Reconversión Regional, para los años 2013 - 2015 considera monto base de distribución interregional US\$ 50 millones.

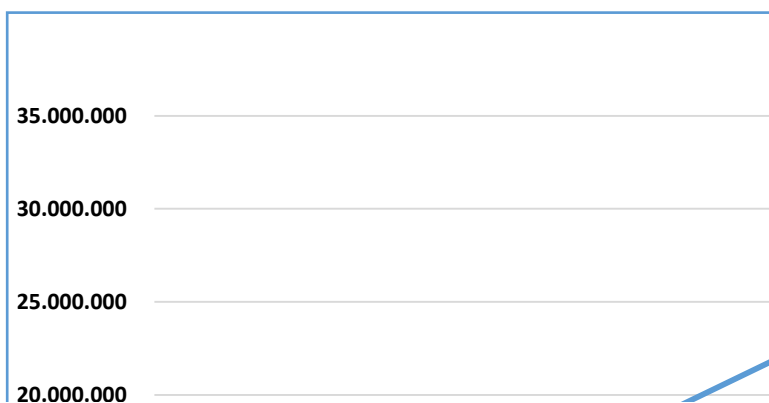

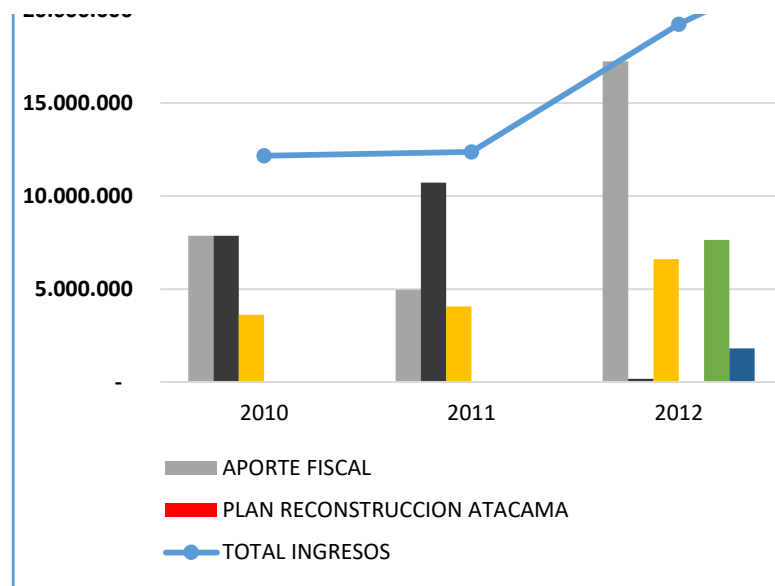

2013	2014	2015	2016	2017	2018
44.254.212	43.607.811	49.826.497	61.429.374	61.291.241	59.742.273
191.633	187.021	184.603	184.603	184.244	184.244
419.340	409.247	403.957	403.957	403.171	403.171
15.393.697	16.938.553	19.348.993	17.846.287	17.810.888	18.251.893
5.278.050	3.335.526	3.899.369	3.812.993	3.724.389	3.752.974
571.569	562.182	554.916	554.916	553.836	553.836
729.566	1.063.152	1.834.738	4.531.936	422.712	974.700
7.732.682	6.523.459	9.037.675	8.779.495	9.847.029	9.991.143
-	-	-	9.508.406	10.601.122	14.618.849
-	69.439	-	-	-	-
7.027.738	7.273.427	6.480.224	6.431.763	11.437.237	6.095.577
960.634	1.143.448	935.027	1.038.897	873.949	850.631
270.792	460.397	500.766	453.758	495.051	456.504
5.484.788	5.569.642	5.654.355	2.809.039	3.037.897	2.971.856
187.718	66.585	65.725	65.114	106.846	66.726
6.005	5.734	926.150	5.008.210	1.792.871	570.169

2013	2014	2015	2016	2017	2018
44.254.212	43.607.811	49.826.497	61.429.374	61.291.241	59.742.273
1.346.545	1.734.592	3.349.447	10.128.707	2.802.998	2.132.284
20.671.748	20.274.079	23.248.362	21.659.280	21.535.277	22.004.867
9.018.451	9.506.039	8.536.658	8.544.448	13.466.918	8.023.274
-	-	-	9.508.406	10.601.122	14.618.849
7.732.682	6.523.459	9.037.675	8.779.495	9.847.029	9.991.143
5.484.788	5.569.642	5.654.355	2.809.039	3.037.897	2.971.856

Educacional, Otras Transferencias Subdere y Saldo Inicial de Caja

Patentes de Acuicultura

distribución interregional de US\$ 100 millones, desde 2016 en adelante, monto base de

